

板橋区かわまちづくり 連絡通路工事

荒川下流河川事務所
令和 8 年 1 月 9 日

○連絡通路工事の概要



➤ 工事状況

板橋区かわまちづくり連絡通路工事(概要)



工事概要	
カルバート工	約300m ³
基礎工	10本
軽量盛土工	約200m ³
階段工	1式
擁壁工	約130m

カルバート工、軽量盛土工、擁壁工を施工中

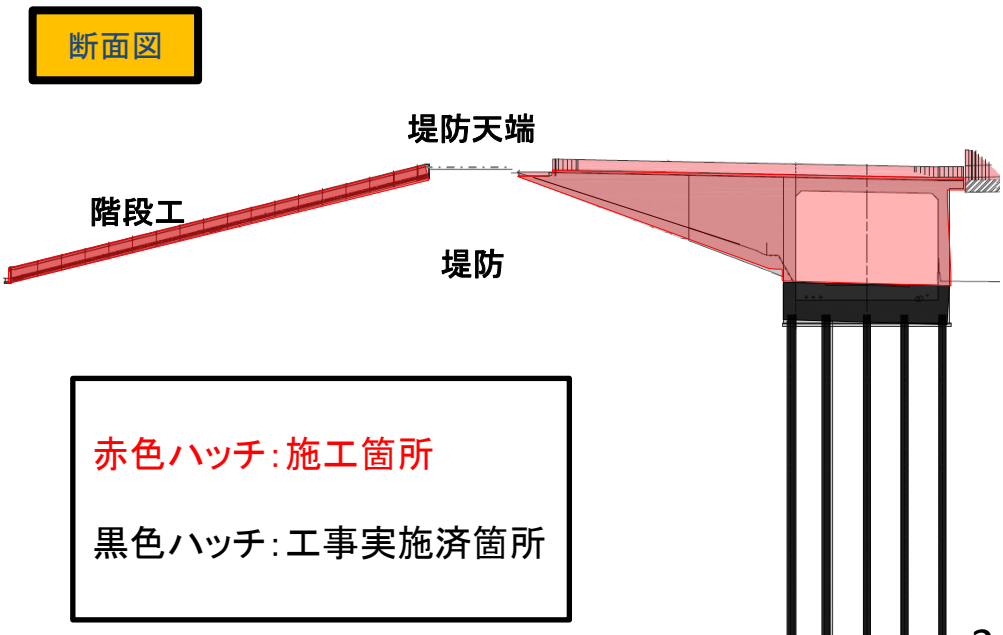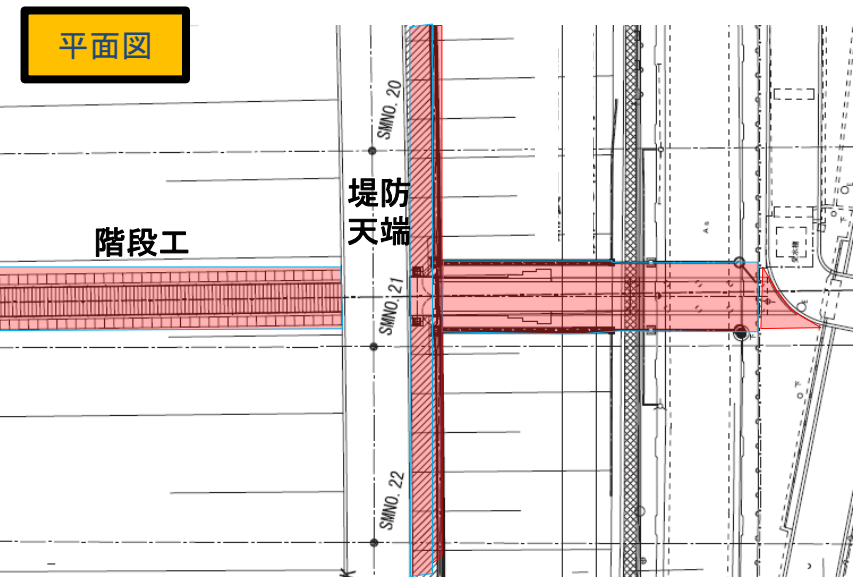

～意匠、堤防側施設形状・配置等は変更の可能性があります～

板橋区かわまちづくり連絡通路工事(概要)

- 下部工事 : 令和6年8月20日から令和7年5月30日まで(完了)
 - 工事名 : R5荒川下流右岸板橋地区連絡通路下部工事
 - 受注者 : 伊藤組土建株式会社

- 上部工事 : 令和7年9月16日(着手) 令和8年3月25日まで(予定)
(契約:令和7年4月11日)
 - 工事名 : R6荒川下流右岸板橋地区連絡通路上部他工事
 - 受注者 : 松井建設株式会社

R7年5月



カルバート工の基礎、底板を施工して下部工事は完成。

R7年12月



カルバート工の壁面部立ち上げ施工。足場などの仮設工を施工。

R7年12月



堤防法面部で軽量盛土(EPS)施工のため段切り実施。

R7年12月



堤防天端部で擁壁工を実施。

イメージパース 下流上空より

R6.10.4
地元説明会資料より抜粋

～意匠、堤防側施設形状・配置等は変更の可能性があります～

