

板橋区かわまちづくり 連絡橋工事説明

荒川下流河川事務所
令和7年1月10日

1. 連絡橋工事のスケジュール等

- 事業概要
- 工事概要
- 工事スケジュール
- 通行止めの周知方法
- 施工ステップ

2. 連絡橋の完成イメージ

- イメージパース

「かわまちづくり」とは

「かわまちづくり」とは『河川空間とまち空間が融合した、良好な空間形成を目指す取り組み』のことです。

- 地域の歴史や文化、人々の生活とのつながりなど、水辺にはその地域特有の「資源」があり、水辺はその使い方や「知恵」によって新たな価値を生み出す可能性を秘めています。
- 「かわまちづくり」では、「かわ」とそれにつながる「まち」を活性化するため、地域の「資源」や地域の創意に富んだ「知恵」を活かし、地域の「顔」、そして「誇り」となるような空間形成を目指します。



イメージ

連絡橋を工事する場所は、新河岸陸上競技場前の 荒川堤防沿い道路です。



平常時は、荒川堤防へのアクセスが容易になります。

- 荒川の堤防と新河岸陸上競技場を「連絡通路」でつなぐことにより、地域の方々、河川利用者が、堤防沿い道路上を横断せずに移動が可能となります。
- これにより、水辺空間の利便性・回遊性を向上させ、にぎわいの創出を目指します。
- 連絡橋は、令和8年3月に完成予定です。





イメージパース（意匠、堤防側施設形状・配置等は変更の可能性があります）

板橋区かわまちづくり連絡橋工事(概要)



工事概要

カルバート工	約300m ³
基礎工	10本
軽量盛土工	約200m ³

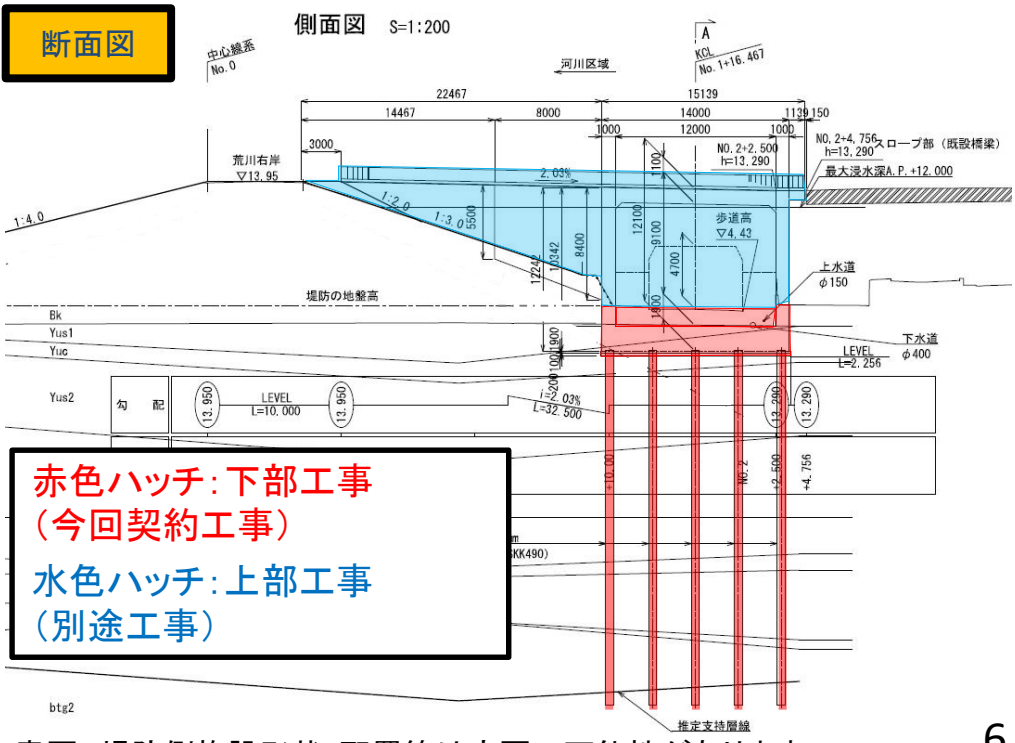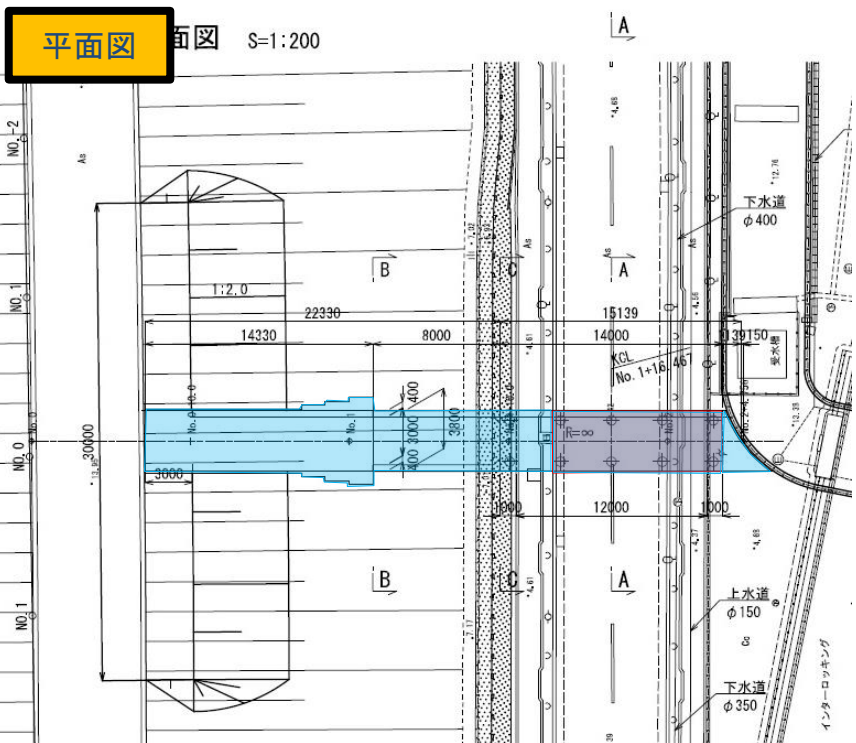

- 下部工事：令和6年9月から令和7年5月まで(予定)
【コンクリート構造の下側部分地面の高さ迄です。以下工程表の赤線部分です。】
- 上部工事：令和7年8月から令和8年3月まで(予定)

工事	令和6年					令和7年												令和8年		
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
下部工事																				
上部工事																				
通行止め期間																				

★現在、工事受注者が**工事に要する期間を調整中**で、上の工程表の「**工事期間**」と「**通行止め期間**」が**変更となる可能性**があります。

下部工事(今回契約工事)


- ・ 工事名：R5荒川下流右岸板橋地区連絡通路下部工事
- ・ 受注者：伊藤組土建株式会社

■ 地元説明会による周知【今回の説明会です】

- 特に通行止めの影響の大きい、以下町会・自治会に対して、**地元説明会**により周知します。
- 新河岸一丁目自治会、都営新河岸団地自治会、新河岸八号館自治会、新河岸九号館自治会、新河岸二丁目自治会、新河岸町会、赤塚河岸町会。【緑色ハッチ部分】


■ 通行止め看板(予告含む)による周知

- 通行止め箇所に流入する以下主要路線等に、**通行止め看板(予告含む)**を設置し、通行止め情報および「**高島通りへの迂回**」を周知します。(地元路線の渋滞をできる限り避けるため)
- 荒川堤防沿い道路、新河岸中央通り、市場通り、高島通り等。【青点線部分】

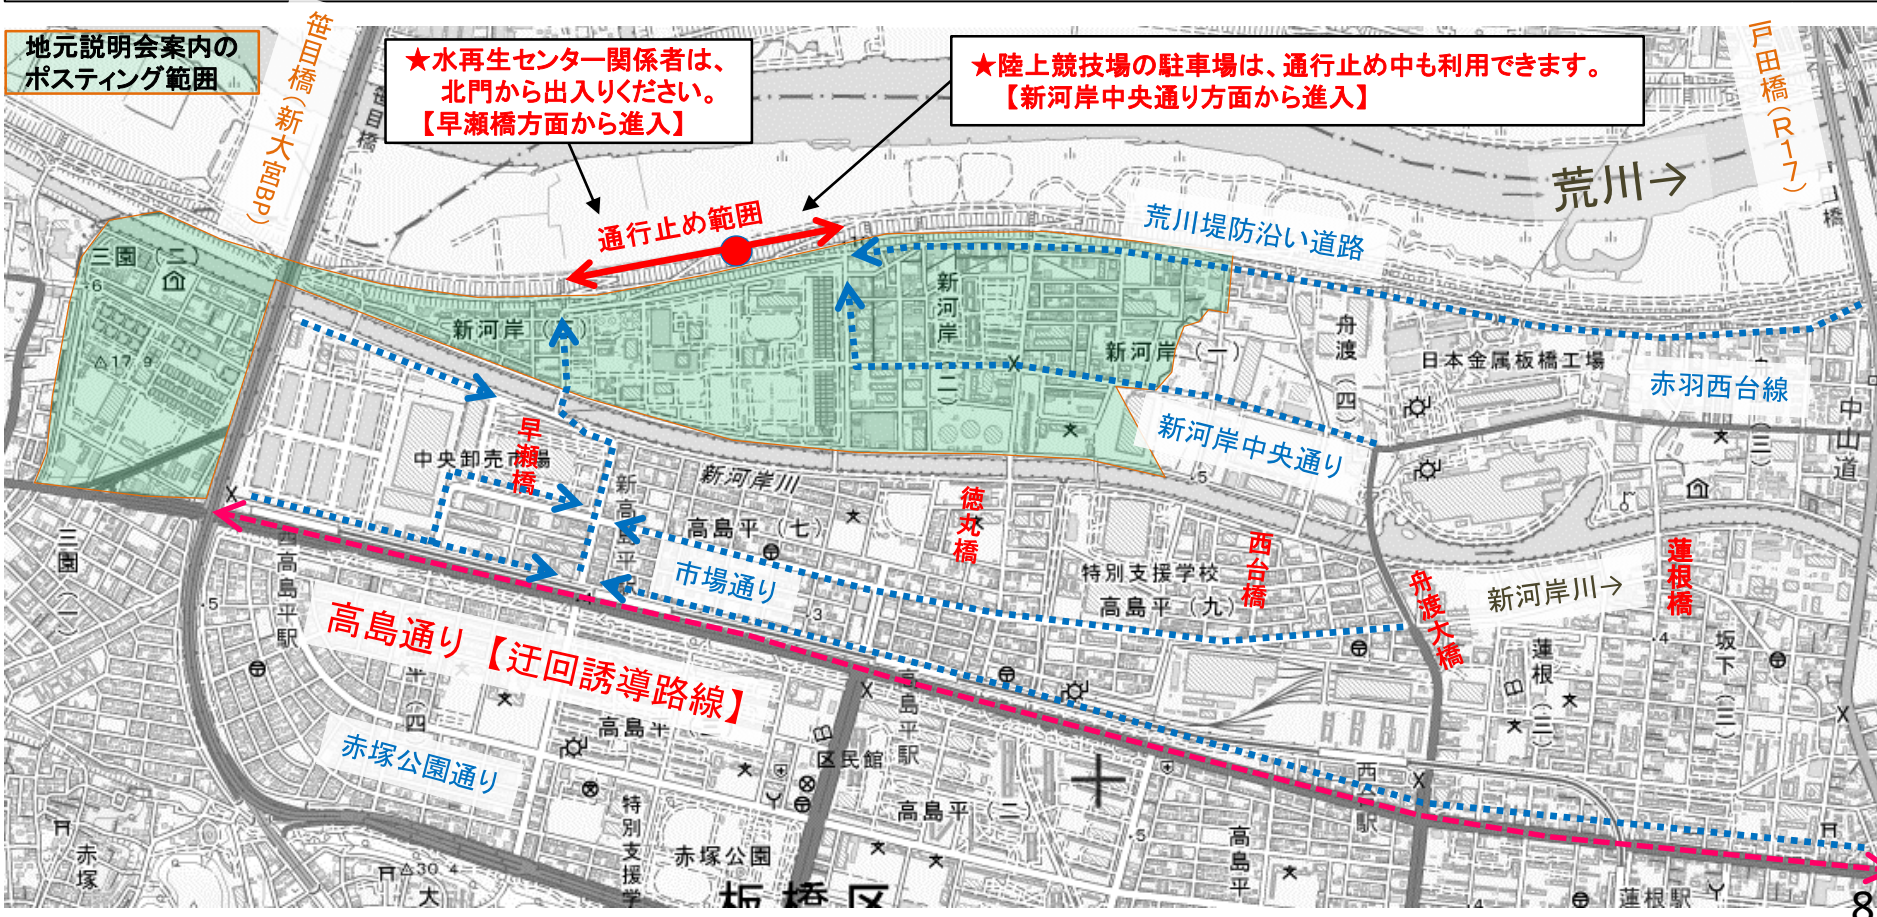

板橋区かわまちづくり連絡橋工事(施工ステップ)



STEP1:杭施工(下部工事で実施)

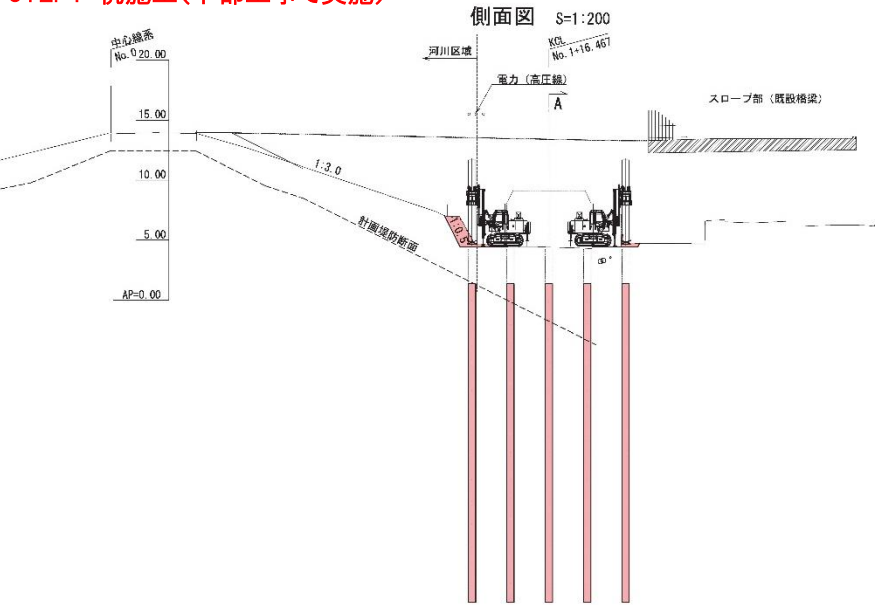

STEP1:杭施工




STEP2:鋼矢板打設(下部工事で実施)

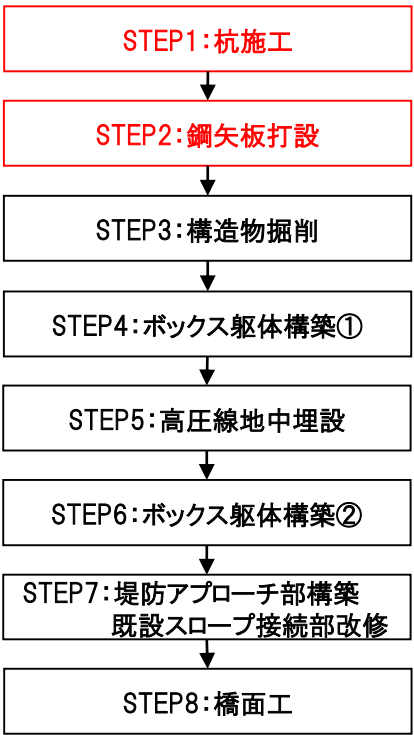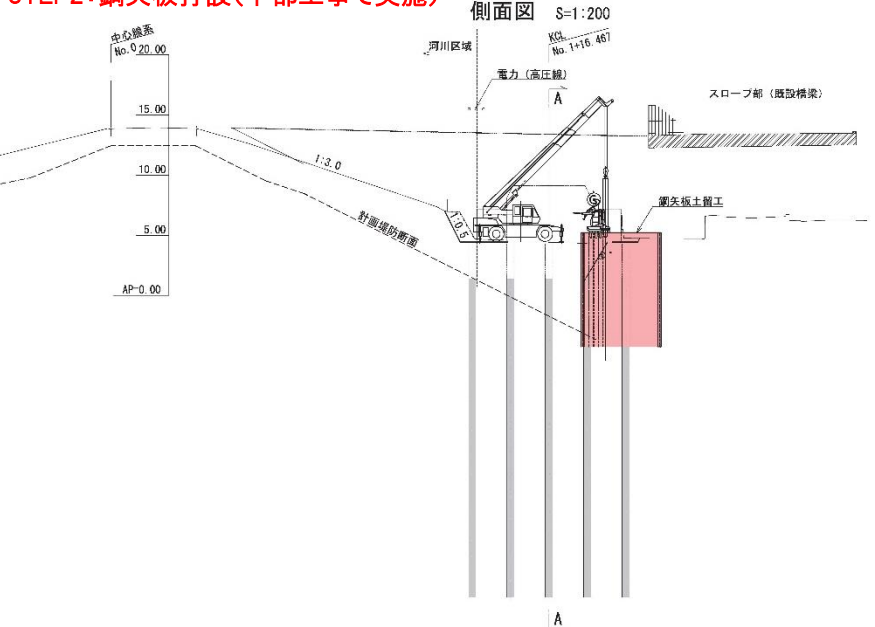



下部工事

板橋区かわまちづくり連絡橋工事(施工ステップ)

STEP3: 構造物掘削(下部工事で実施)

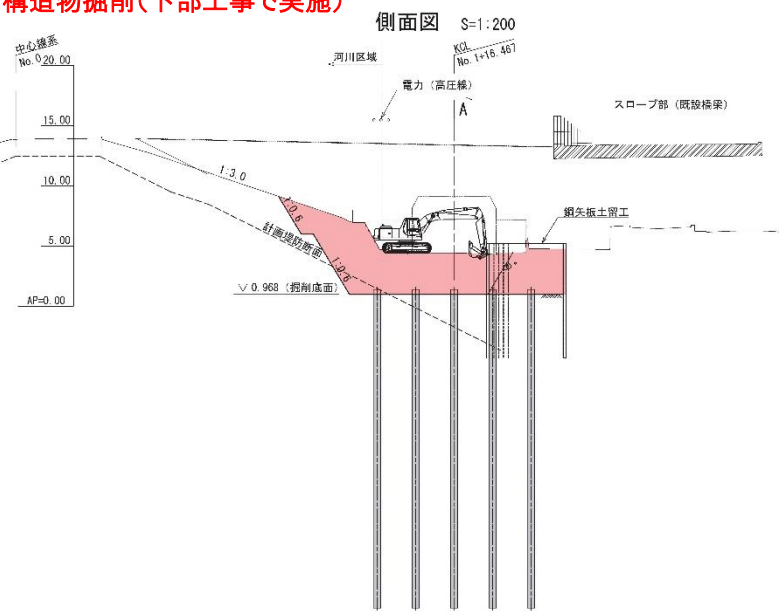


STEP4: ボックス躯体構築①(下部工事で施工実施)

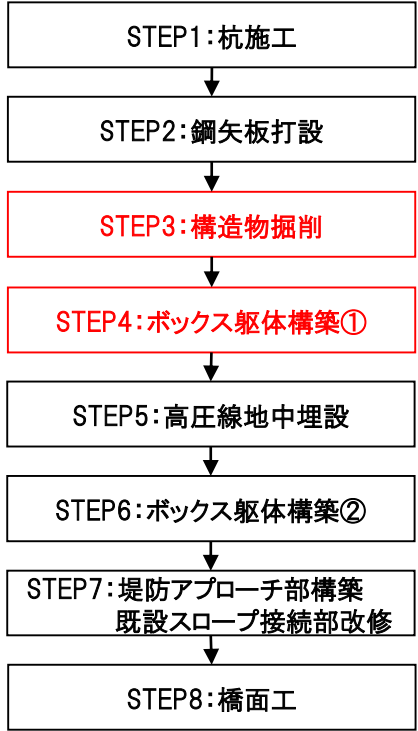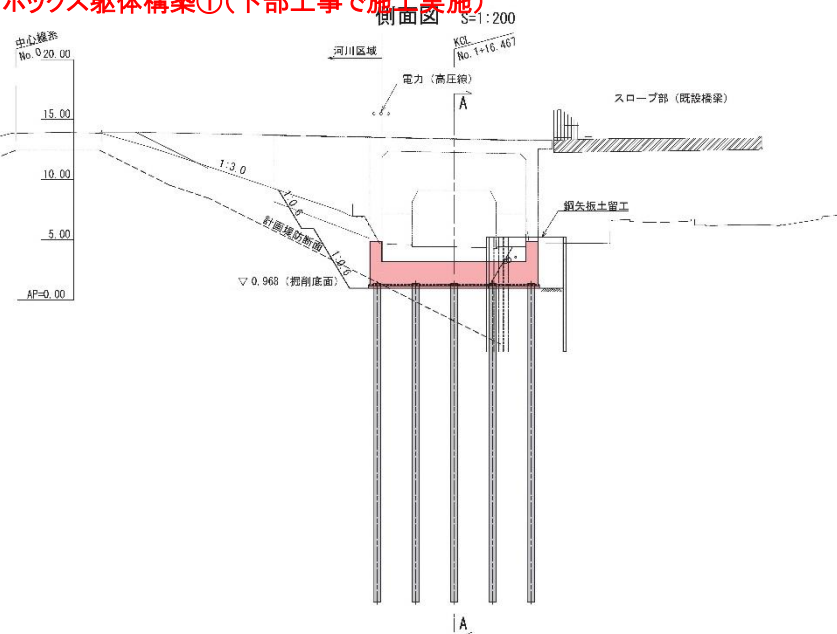



下部工事

板橋区かわまちづくり連絡橋工事(施工ステップ)

STEP5: 高圧線地中埋設(下部工事で実施)

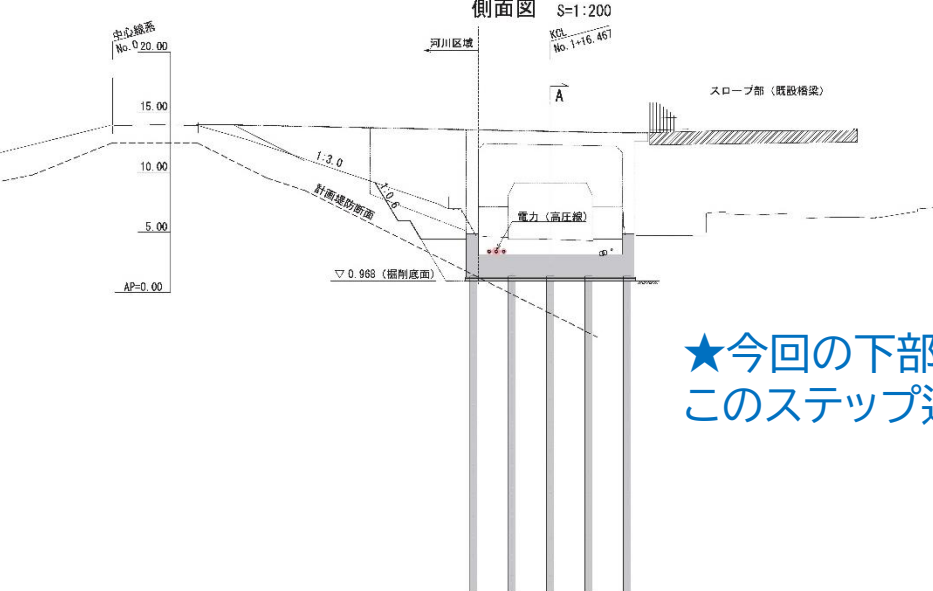

STEP6: ボックス躯体構築②(上部工事で実施)

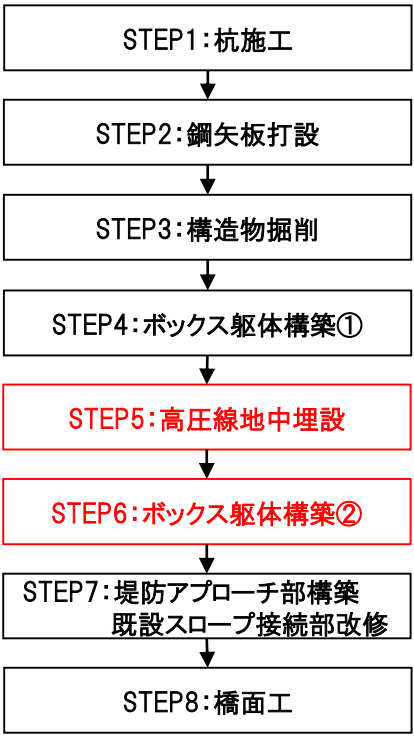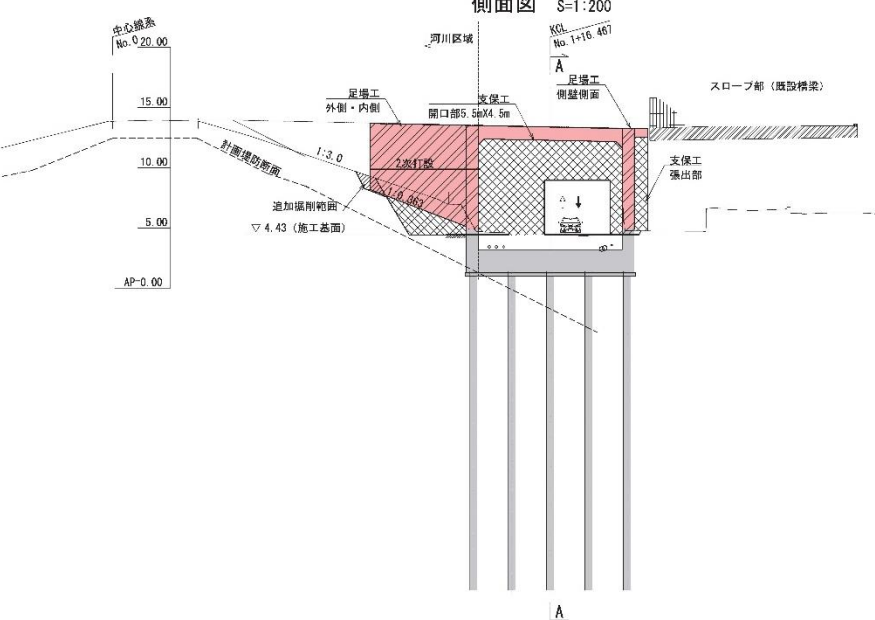


下部工事





板橋区かわまちづくり連絡橋工事(施工ステップ)

STEP7: 堤防アプローチ部構築 (上部工事で実施) 既設スロープ接続部改修

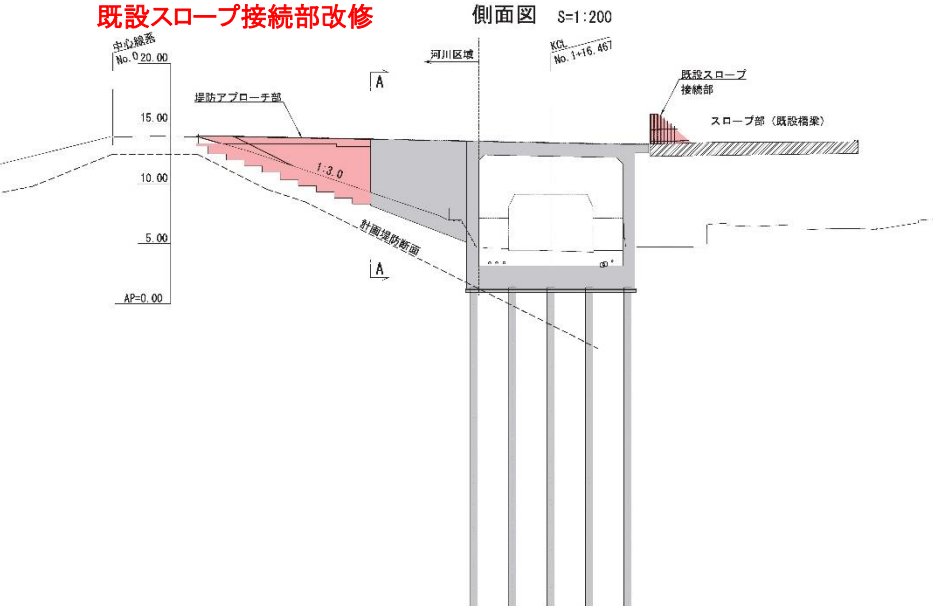

STEP8: 橋面工(周辺整備工事で実施)

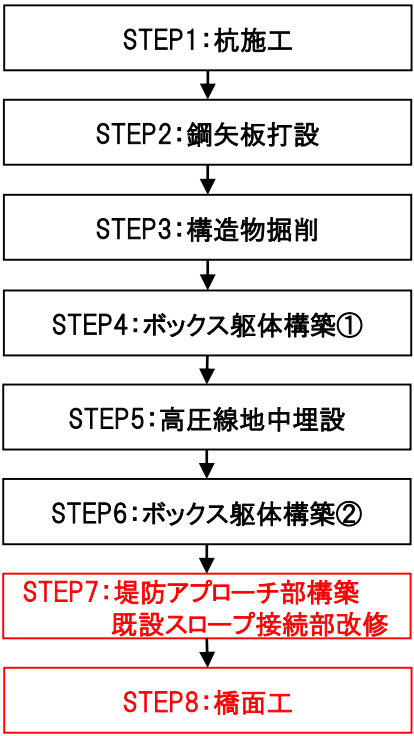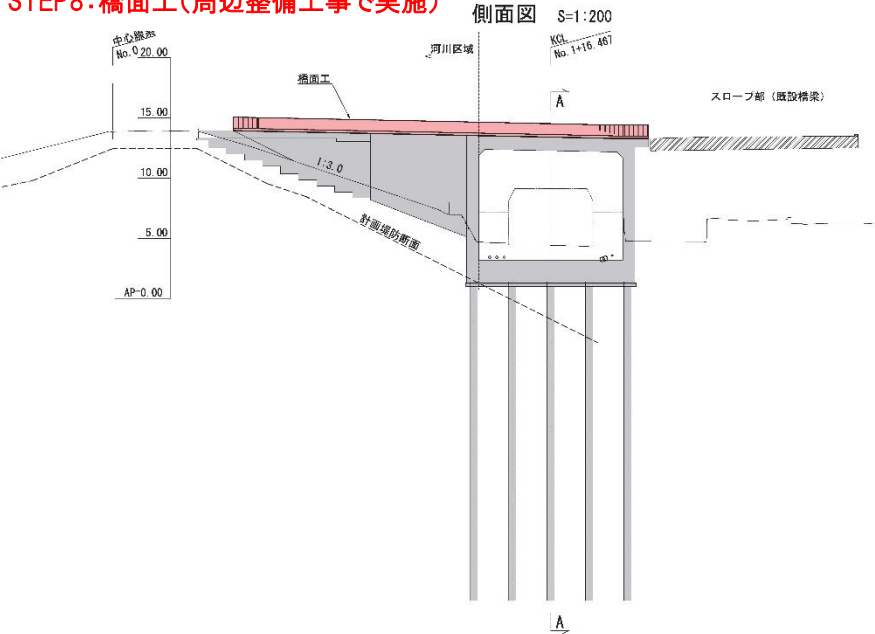


下部工事



イメージパース 下流天端より

R6.10.4
地元説明会資料

～意匠、堤防側施設形状・配置等は変更の可能性があります～

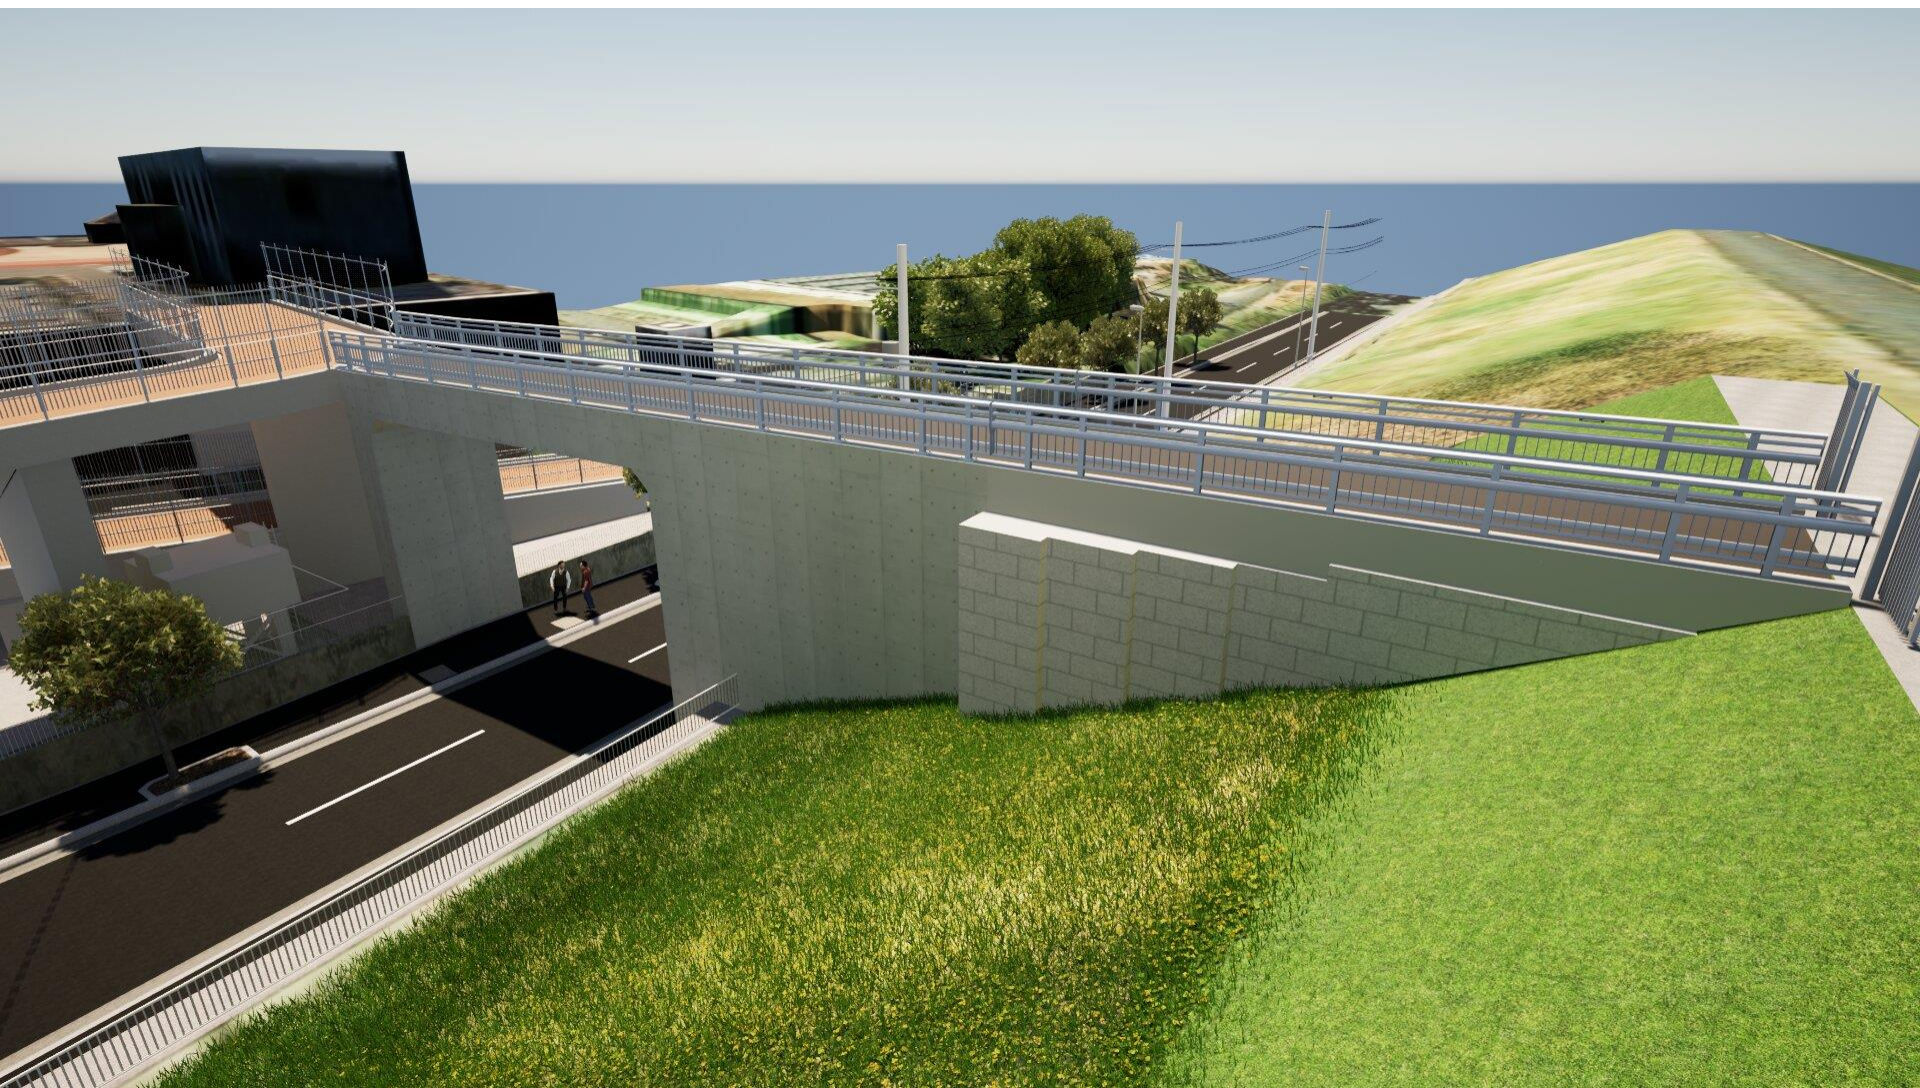

～意匠、堤防側施設形状・配置等は変更の可能性があります～



イメージパース 上流競技場側より

R6.10.4
地元説明会資料

～意匠、堤防側施設形状・配置等は変更の可能性があります～




～意匠、堤防側施設形状・配置等は変更の可能性があります～



着工前



施工中

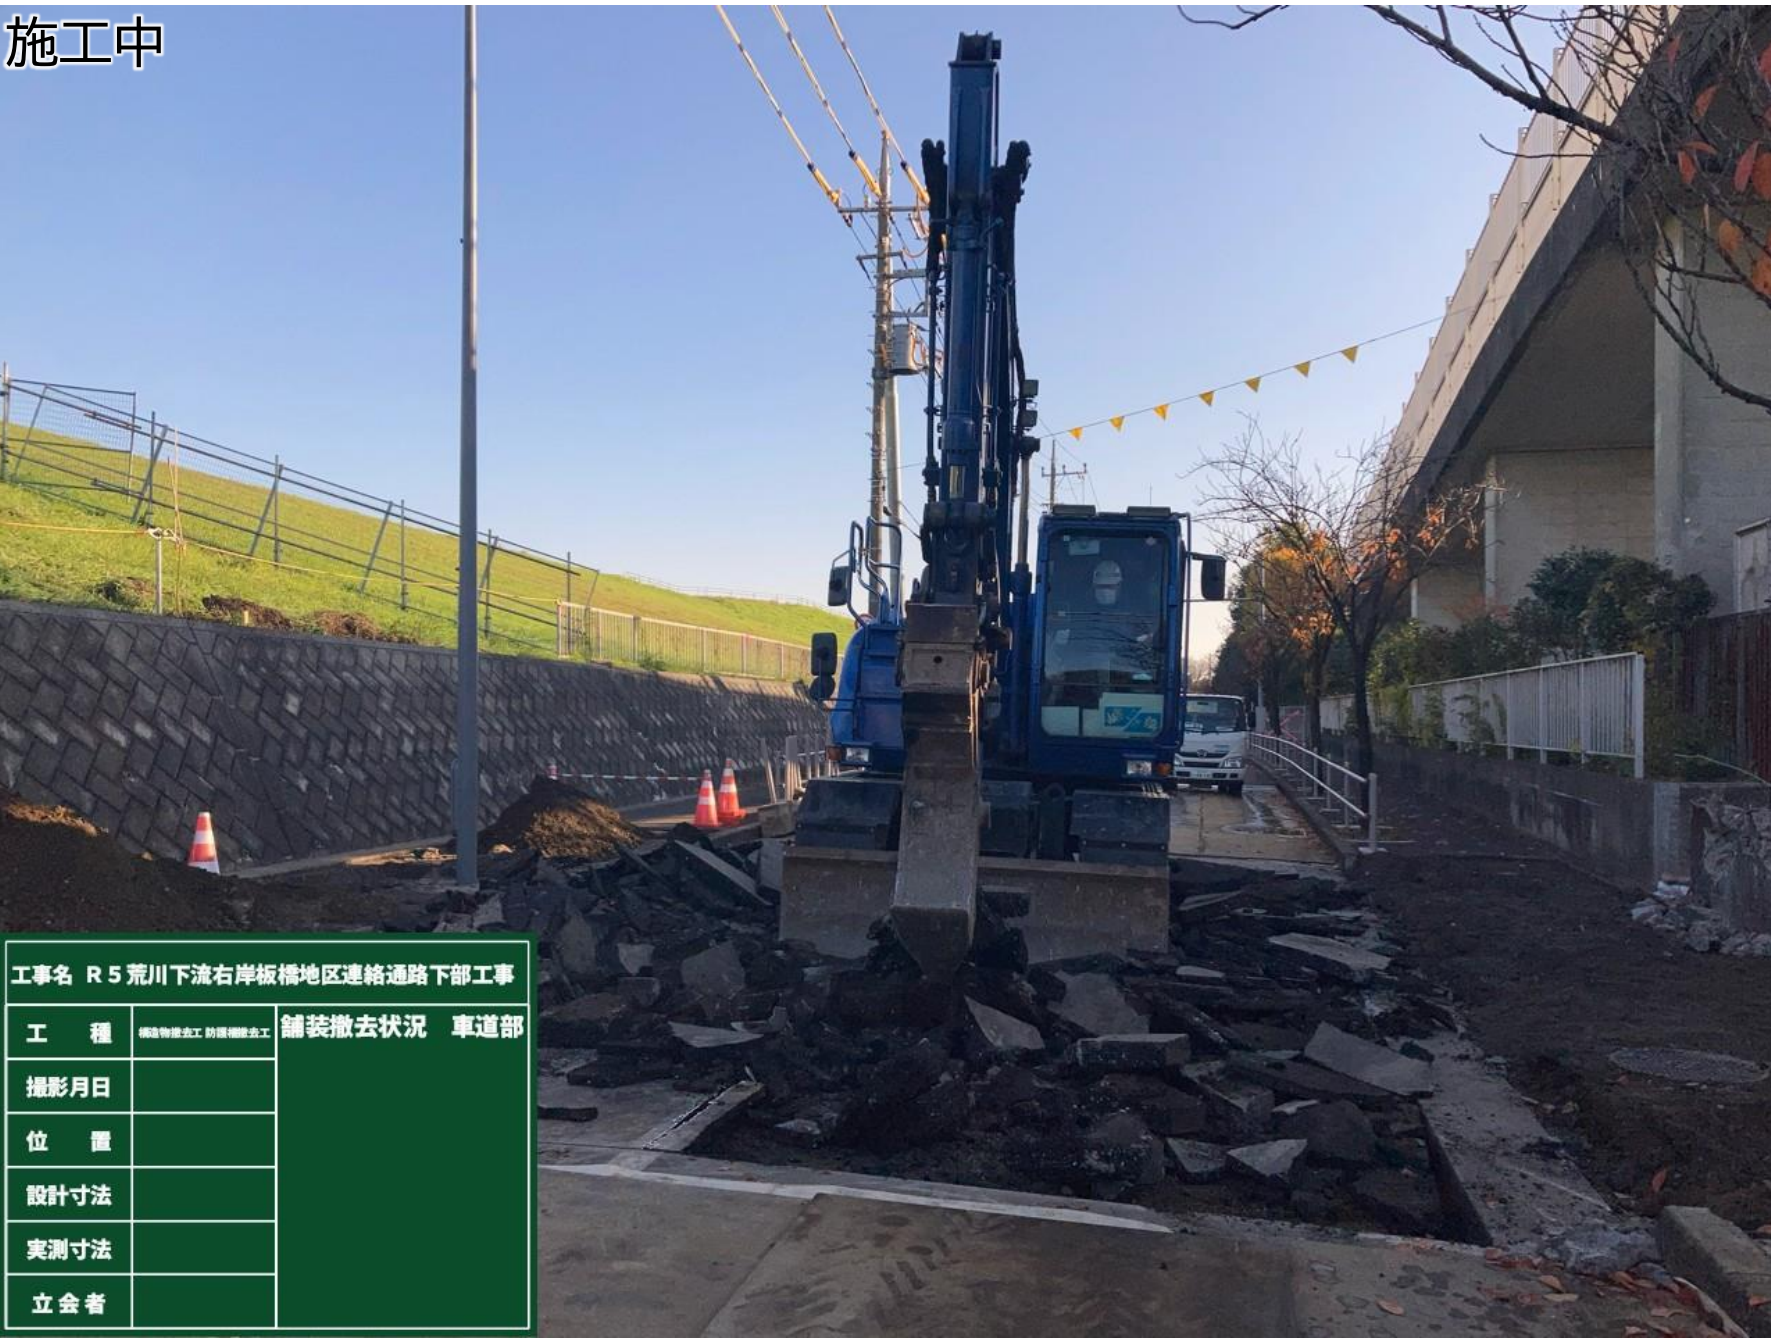

工事名 R5 荒川下流右岸板橋地区連絡通路下部工事

工 種	橋梁物産主工 防護欄撤去工	舗装撤去状況 車道部
撮影月日		
位 置		
設計寸法		
実測寸法		
立 会 者		

施工中



工事名 R5 荒川下流右岸板橋地区連絡通路下部工事		
工 種	橋梁施設 架工 橋梁物取壊し工	間知ブロック取壊し状況
撮影月日		
位 置		
設計寸法		
実測寸法		
立 会 者		

R6.12.26時点

